



稗原川 河川災害復旧工事 『現場だより』 VOL.4

現場からのお知らせ

工事進捗 【1月までの進捗】：63%

地元工事関係者の皆様におかれましては、健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。本年も引続き工事についてご理解とご協力をお願い申し上げます。

さて今月は、①ブロック積（環境保全型）作業 ②付随する小口止・ブロック取付作業を行いました。その中で、今月は通常『ブロック積』といわれる（間知ブロック）の様子を紹介します。

①ブロック吊込み搬入



②ブロック積状況（一個づつ積上げます。）



③ブロック設置完了



④ブロック背面へ抜板設置
・埋戻し土砂搬入敷均し



⑤裏込砕石投入状況
（ブロック背面は砕石を入れます。）



⑥裏込砕石敷均し状況



⑦ブロックの胸込コンクリート打設



⑧コンクリート締固め状況



⑨裏込砕石・埋戻し土砂転圧状況



これで一段分のブロック積が完了します。



着手前(9月)



現在(1月)

※ 裏面へ

いま現場では…

引き続き、各種ブロック積およびこれに付随する工事を行っています。




ブロック積について

この部分のブロック積は歩道橋下部分の護岸計画が変更になります。そのため、変更確定後の施工時に同時に積み上げます。
※このまま積み上げると右側が空洞状態であるためブロックが傾いてしまうため。

歩道橋

ブロックを最上段まで積上げました。

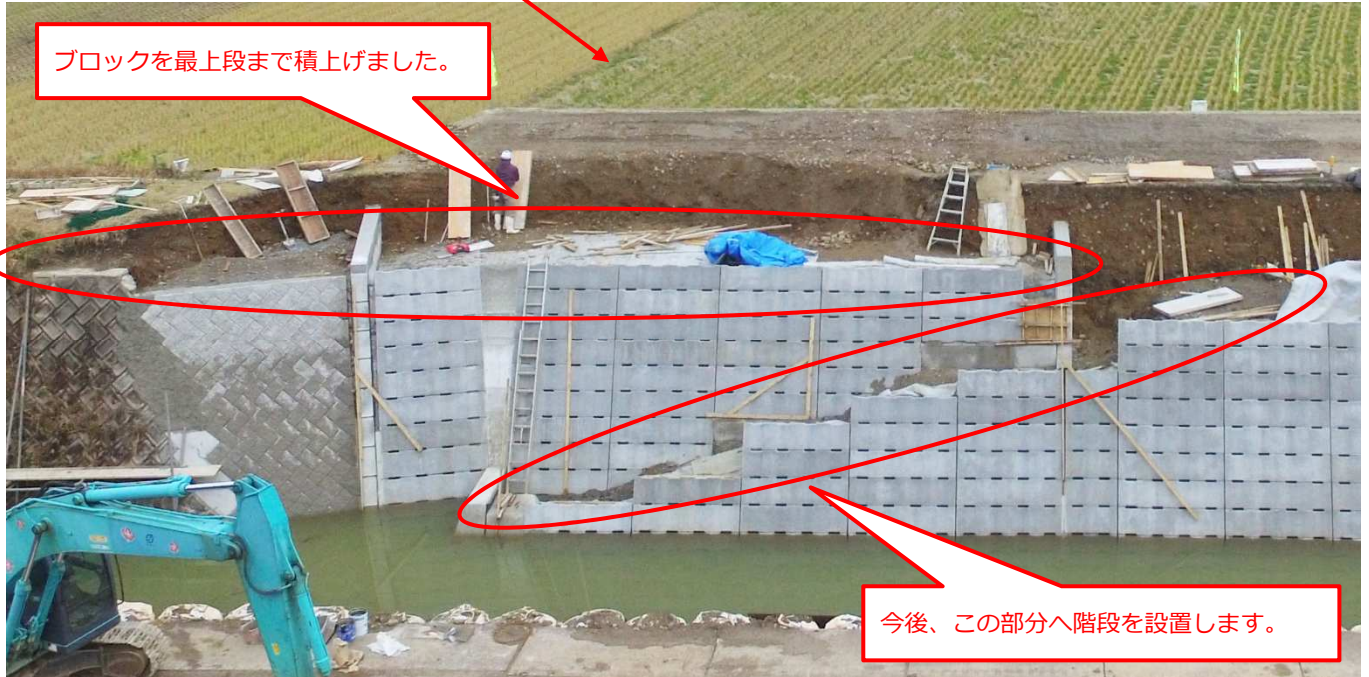

今後、この部分へ階段を設置します。

今後の工事予定（2月）

- ① 積上がったブロックの天端処理（コンクリート打設・盛土）
- ② 上記、階段工に関する工事を行います。

地元皆様へのお知らせ・お願い

先月もお知らせしておりますが、歩道橋下の護岸部分については引き続き各関係機関にて調整されている最中です。そのため正式な連絡を現段階で行う事はできませんが、工期について延期しなければならない状況となりそうです。この辺りについては正式に決定次第、改めて地元皆様にお知らせさせていただきます。

また、引き続き資材の搬入等でトラックの往来があります。弊社としても安全に十分留意し運行いたしますので何とぞご理解・ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

稗原川 河川災害復旧工事（30災39号）現場だよりへのご意見・ご質問等



引き続きご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。

◆【連絡先】稗原川 河川災害復旧工事（30災39号）作業所
〒693-0213 出雲市朝山町 1172-1（新宮組 2F）
電話：0853-48-2060（ファックス兼用）
E-mail：k-moriwaki@kamuken.co.jp
担当：森脇

◆【本社】有限会社 嘉村建設
〒693-0105 出雲市宇那手町 355
電話：0853-48-0130
ファックス：0853-48-0168
URL：<https://www.kamuken.co.jp>
