



赤川 県単河川緊急整備工事 VOL.2 平成27年1月発行
 国道9号橋下部工 第1期 工事現場だより

現場からのお知らせ

新春のお喜びを申し上げます

おすこやかな新春をお迎えのことと存じます。昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。本年も国道9号橋下部工 第1期工事について、どうぞよろしくお願い申し上げます。

工事進捗

国道9号のコンクリート構造物の取壊し・撤去および土砂搬出作業を主に実施しました。その他、国道9号迂回路から出入りする工事用道路の工事にも着手しています。

【12月の進捗】 実施：29%



国道9号 着手前



国道9号 12月末現在



国道9号（跨線橋）着手前



国道9号（跨線橋）12月末現在

いま現場では…

- ① 跨線橋の取壊しと、コンクリート殻のダンプトラックによる搬出作業
- ② 重機による土砂掘削を行い、ダンプトラックによる搬出作業
- ③ 工事用仮設道路の設置作業を行っています。



構造物の取壊し作業状況
 (2種類の方法で作業しています。)

方法①：圧砕クラッシャーを使用
 (騒音・振動が発生しない)



方法②：ブレイカを使用
 (トン・トン・トンと音がします。)




現場では近隣住民の皆様への騒音・振動等を最小限にするべく努力しております。(主に上記方法①での作業)しかし、上記方法②についてはどうしても音が発生します。そこで、騒音を最小限に抑える超低騒音のブレイカ(国土交通省・新技術情報提供システム「NETIS」に登録)を使用しています。

今後の工事予定（1月）

- ・ 構造物取壊し作業（跨線橋部分）
- ・ 土砂搬出作業（国道9号）
- ・ 国道9号迂回路からの仮設道路設置作業（下図参照）

【1月の進捗予定】68%

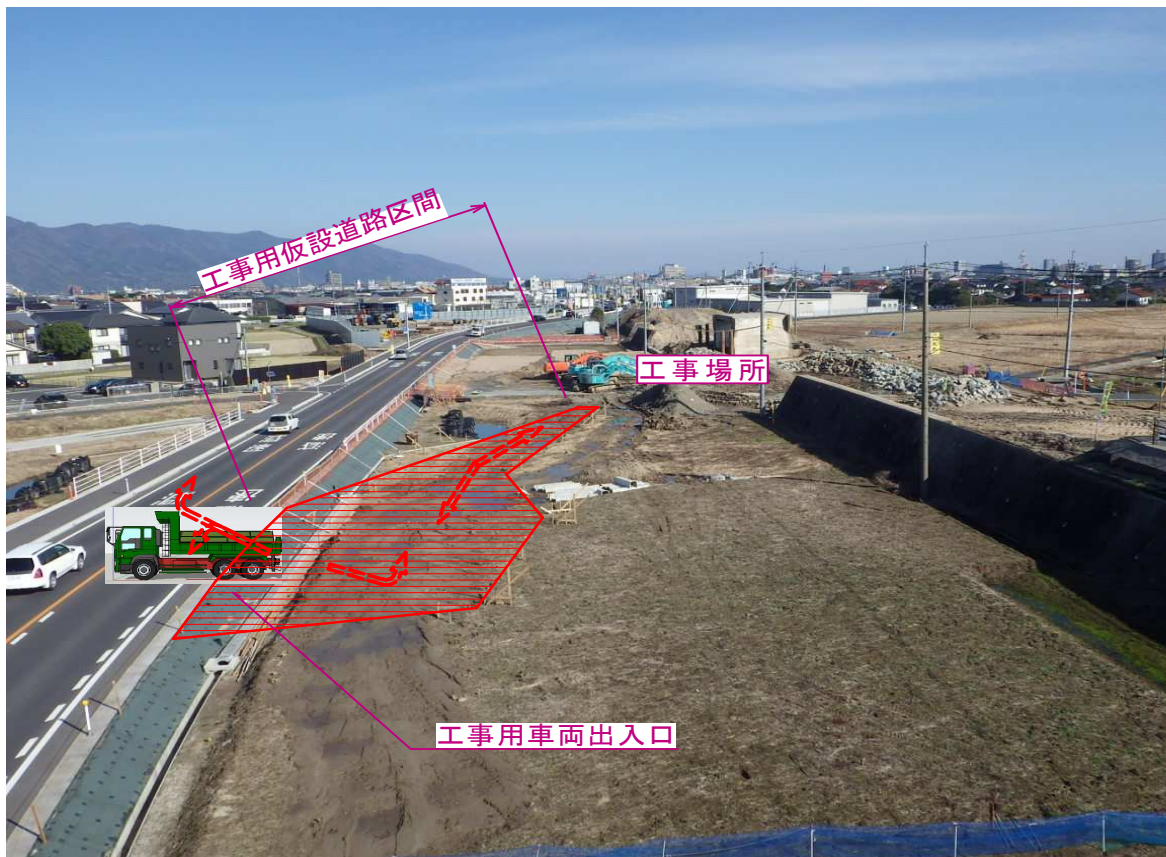

地元皆様へのお願い



現在、現場で進めております構造物取壊し作業（主に跨線橋部分）は1月中旬で終了予定です。特に近隣家屋の皆様方にはもうしばらくの間、騒音・振動等でご迷惑をお掛けいたしますが何とぞご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。

国道9号橋下部工 第1期 工事現場だよりへのご意見・ご質問等

- ◆【作業所】赤川 県単河川緊急整備工事 国道9号橋下部工 第1期作業所
〒693-0006 出雲市白枝町 262（オリーブハウス 2F）
電話：0853-28-3015（ファックス兼用）
E-mail：kamada@kamuken.co.jp
担当：鎌田・嘉村
- ◆【本社】有限会社 嘉村建設
〒693-0105 出雲市宇那手町 355
電話：0853-48-0130
ファックス：0853-48-0168
URL：<http://www.kamuken.co.jp>
