



【最終号】

赤川 県単河川緊急整備工事

VOL.5 平成 27 年 4 月発行

国道 9 号橋下部工 第 1 期 工事現場だより

現場からのお知らせ

工事進捗

3 月に行った主な工事について

- ① 地盤改良工事
(パワーブレンダー工法)
- ② 工事用進入路工事
(地盤改良・砕石入れ)

【3 月末での進捗】 実施：89%



国道 9 号 着手前



国道 9 号 3 月末現在

跨線橋については完全に跡形がなくなりました。



国道 9 号 (跨線橋) 着手前



国道 9 号 (跨線橋) 3 月末現在

いま現場では…

① 地盤改良工事

- ・ 国道 9 号橋の工事を行うにあたり、大型建設機械の搬入や地下水位より低い位置での橋台設置を行うため、止水を目的とした地盤改良 (パワーブレンダー工法) 工事を行いました。



① プラント施設設置



② 区画割 (区画毎に改良)



③ 施工機械組立て



④ セメント系固化材搬入



⑤ 改良作業 (攪拌・混合)




地盤改良を行う事で最大で約 50 cm ほど盤が膨上がりました。

今後の工事予定（4月）

- ① 地盤改良（パワーブレンダー工法）工事により膨れた土砂はバックホウにて基準の高さに削り取り、ダンプトラックで搬出します。
- ② 上記作業完了後は工事用進入路（国道9号仮設道路を挟んだ2箇所）の舗装作業（アスファルト舗装）を行います。
- ③ 後片付け（現場内の重機等の搬出や建設資材等を片づけ、現場内の清掃を行います。）

工事用進入路舗装工事

アスファルト舗装を写真の場所で行います。

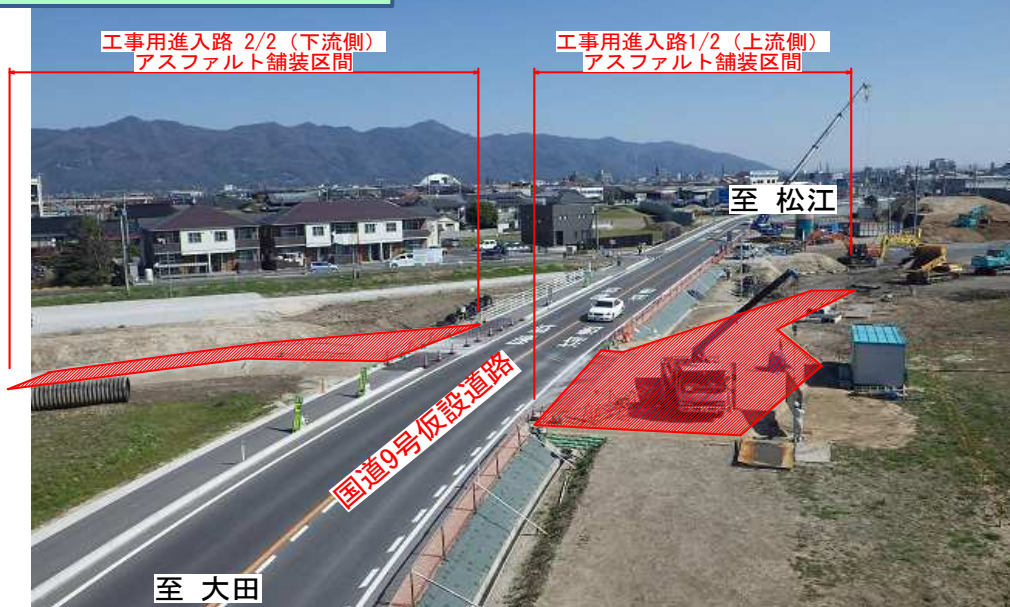

地元皆様へ

先般、発注者の島根県からお知らせがあった通り工期が平成27年4月30日となりました。残る作業は主に上記のアスファルト舗装工事となり、これを終え後片付けを行って工事完了となります。そのため、昨年11月から発刊した「国道9号橋下部工 第一期 現場工事だより」もこの号の発刊をもちまして終了とさせていただきます。特に地元皆様には構造物取壊作業で騒音・振動等でご迷惑をお掛けする事ばかりでしたが、全面的なご理解とご協力を頂き、温かい対応で接して頂いた事は何よりも励みとなりました。この書面を通じて、工事に関わりました全作業者の代表としてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

国道9号橋下部工 第一期 工事現場だよりへのご意見・ご質問等

◆【作業所】赤川 県単河川緊急整備工事 国道9号橋下部工 第一期作業所

〒693-0006 出雲市白枝町 262 (オリーブハウス 2F)

電話：0853-28-3015 (ファックス兼用)

E-mail: k-eiji@kamuken.co.jp

担当：嘉村・鎌田

◆【本社】有限会社 嘉村建設

〒693-0105 出雲市宇那手町 355

URL: <http://www.kamuken.co.jp>



約半年の間お世話になりました。
末筆ながら、ご関係頂きました各関係機関をはじめ地元皆様方の益々のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
