



稗原川 河川災害復旧工事 『現場だより』 VOL.9

現場からのお知らせ


工事進捗 **【6月までの進捗】：90%** **（6月18日現在）**

地元皆様のご協力により、梅雨入りまでに河川内で行う作業を完了する事ができました。そのため先般の大雨洪水警報発令時にも何ら影響を受ける事はありませんでした。（仮に工事が遅れていた場合、河川内の真砂土・大型土のう・敷鉄板等が流出し大損害となっていた事と思われます。）間一髪という状況でした… さて、現在全てのブロック積作業が完了し、付随する構造物工事を行っております。

【今月の作業の様子】橋台取付部分の擁壁（ようへき）工事



①型枠組
(橋の上下流それぞれで作業しました。)

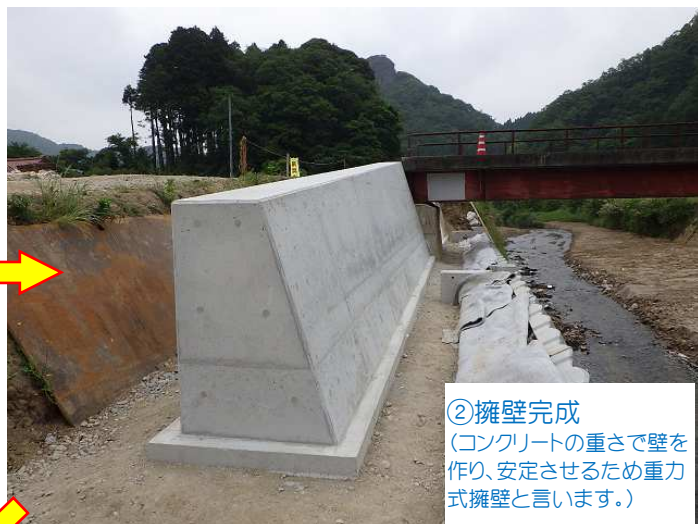

②擁壁完成
(コンクリートの重さで壁を作り、安定させるため重力式擁壁といいます。)



③擁壁背面埋戻し作業
(20cm毎に真砂土を入れ締固めながら埋戻しを行っています。)



④擁壁背面埋戻し作業
(壁面際については小型転圧機を用いて入念に締固めています。)



着手前(9月)



現在(6月)

いま現場では…

ブロック積の天端部分はコンクリートで被うため、型枠を組みコンクリートを打設します。その他、構造物施工については今月で全て完了する予定です。



橋桁、下面は作業スペースが限られるため難儀しております。



河川内からの様子



護岸復旧全景(6/18現在)

今後の工事予定(7月)

今月中に、①仮設道(真砂土)撤去作業 ②田畑復旧作業にも着手するため、7月には市道復旧作業(コンクリート・アスファルト舗装および敷鉄板撤去)を行い全ての工事が完了となります。

地元皆様へのお知らせ・お願い

今後、地元関係者の皆様から借地させて頂いている部分(仮設道路)について真砂土撤去・ダンプによる搬出を行います。そのため大型ダンプトラックの往来があります。地元皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますがご理解とご協力をお願い致します。また、現場周辺の草刈りについても先月行いましたが、直ぐに伸びるため今月も行う予定です。除草時は仮払い機の騒音がありますのでご理解をお願い致します。

稗原川 河川災害復旧工事(30災39号)現場だよりへのご意見・ご質問等



いよいよ来月で全ての工事が完了予定です。
引き続きご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。

- ◆【連絡先】稗原川 河川災害復旧工事(30災39号)作業所
〒693-0213 出雲市朝山町1172-1(新宮組2F)
電話: 0853-48-2060(ファックス兼用)
E-mail: k-moriwaki@kamuken.co.jp
担当: 森脇
- ◆【本社】有限会社 嘉村建設
〒693-0105 出雲市宇那手町355
電話: 0853-48-0130
ファックス: 0853-48-0168
URL: <https://www.kamuken.co.jp>
